

## 振り返る 復旧・復興

### 公費解体

## おおむね事業が終了

開始当初の実施期間(見込み)を大幅短縮

熊本地震により多くの建物が損壊した本町。被害に遭った多くの人々が、安心して暮らせる生活基盤を失ってしまいました。

要施策の一つと位置付け、昨年6月1日の組織再編で環境衛生課を新設。県内では甲佐町に続く早期に、解体に着手しました。

### 進捗率の向上

昨年7月7日に(工事)着手

それでも前を向いて進もうとする人の生活再建の前提となるのが、住めなくなってしまうた自宅の解体です。

昨年4月25日に激甚災害の指定を受けた熊本地震。

同5月3日には、環境省により阪神・淡路大震災、東日本大震災に続き、半壊以上の損壊家屋等の解体・撤去を補助する方針が示されました。

事業の詳細がなかなか決定されず、被災者からの問い合わせが殺到する中、町では、公費解体事業を復旧・復興事業の最重要




した公費解体ですが、当初は11班体制でスタートし、徐々に班体制を増強しましたが、災害廃棄物のリサイクル化・減量化のための分別作業や仮置場の混雑などで、進捗率と思うように上がらない状況が続きました。しかし、分別基準の一部緩和、仮置場の改修、解体班数のさらなる増強(最大140班)などで進捗率も順調に伸びてきました。

### 完了目標をクリア

事業開始時は、発災後2年以内の完了を目標として実施してききましたが、当初の目標を前倒

### 損壊家屋解体棟数の推移

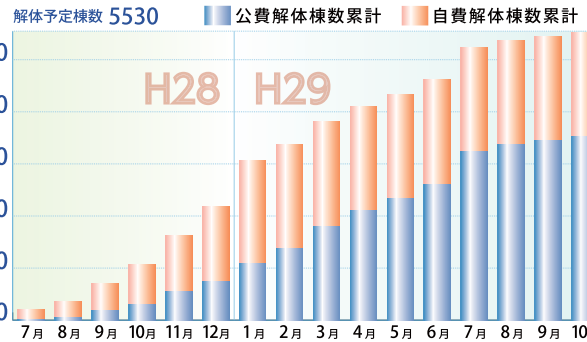

### 損壊家屋等の解体進捗状況

(平成29年10月16日現在)

区分	申請件数	完了件数
公費解体	2,308	2,237
自費解体	1,346	1,346
合計	3,654	3,583
進捗率	98.06%	
	10月未見込み 99%	

し、10月末でおおむね終了となりました。解体実施期間中の、町民の皆さまのご理解とご協力に感謝いたします。

環境衛生課廃棄物対策係  
☎ 289・8077

## 益城中央被災市街地復興土地地区画整理事業(木山復興土地地区画整理事業)の都市計画決定に係る説明会を開催します

木山地区で計画しています益城中央被災市街地復興土地地区画整理事業の都市計画決定(施行区域)に向けた法定説明会を次のとおり開催します。

ご都合のよい日時、場所にご参加ください。

復興整備課復興まちづくり係  
☎ 289 - 2930

### 説明会日程

期日	時間	場所
11月9日(木)	午後7時～9時	町文化会館
11月11日(土)	午後3時～5時	広安小体育館
11月12日(日)	午後3時～5時	広安小体育館
	午後7時～9時	益城中央小体育館
