資料1

【凡例】
- :完了
- :施行中
- :施工予定

（都）益城中央線（県道熊本高森線）事業促進スケジュール：進捗状況

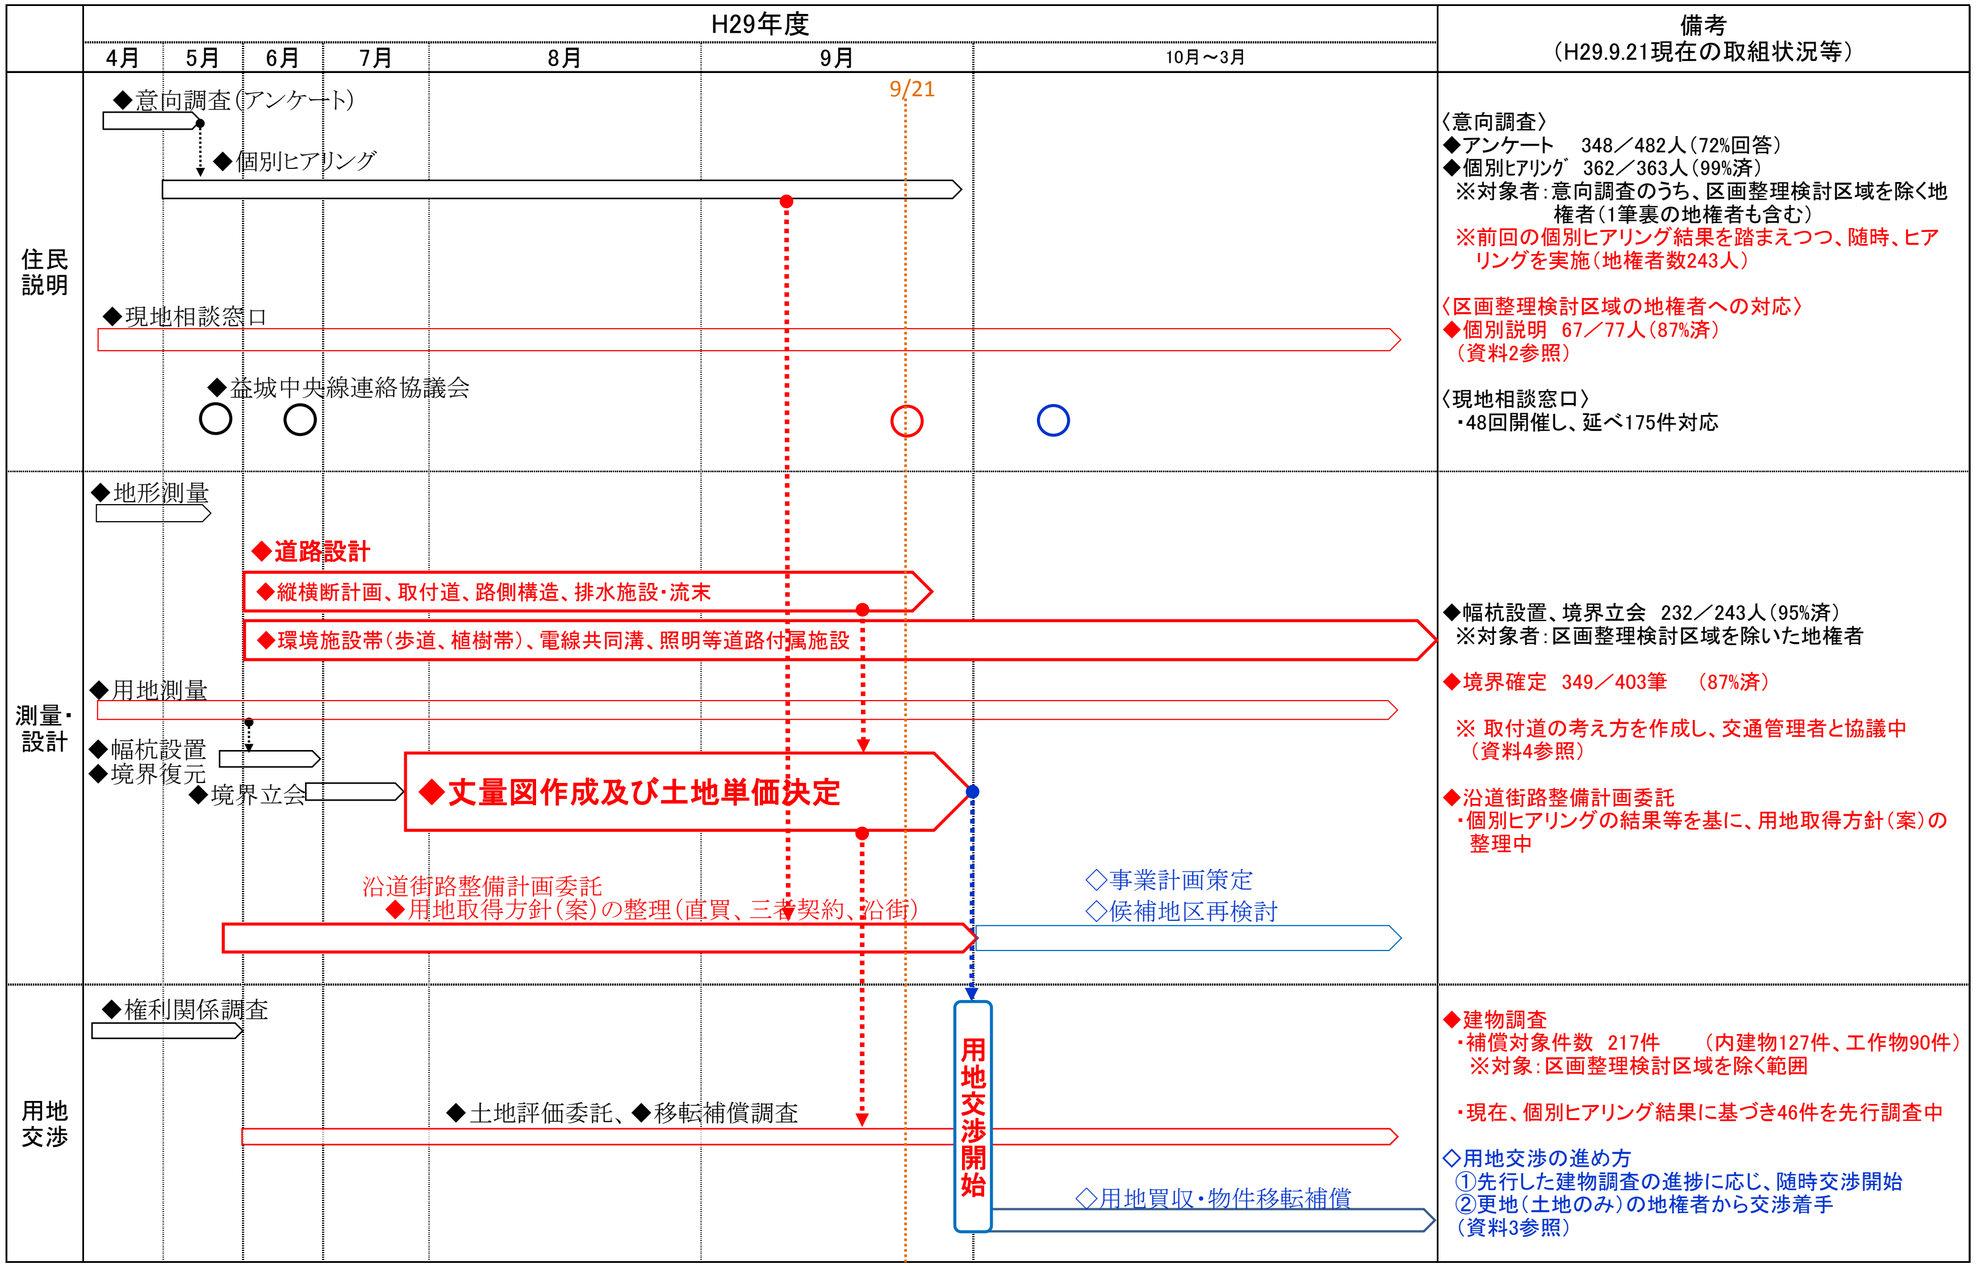

備考（H29.9.21現在の取組状況等）

〈意向調査〉
◆アンケート　348／482人（72%回答）
◆個別ﾋｱﾘﾝｸﾞ　362／363人（99%済）
※対象者：意向調査のうち、区画整理検討区域を除く地権者（1筆裏の地権者も含む）
※前回の個別ヒアリング結果を踏まえつつ、随時、ヒアリングを実施（地権者数243人）

〈区画整理検討区域の地権者への対応〉
◆個別説明　67／77人（87%済）
（資料2参照）

〈現地相談窓口〉
・48回開催し、延べ175件対応

◆幅杭設置、境界立会　232／243人（95%済）
※対象者：区画整理検討区域を除いた地権者

◆境界確定　349／403筆　（87%済）

※ 取付道の考え方を作成し、交通管理者と協議中
（資料4参照）

◆沿道街路整備計画委託
・個別ヒアリングの結果等を基に、用地取得方針（案）の整理中

◆建物調査
・補償対象件数　217件　（内建物127件、工作物90件）
※対象：区画整理検討区域を除く範囲

・現在、個別ヒアリング結果に基づき46件を先行調査中

◇用地交渉の進め方
①先行した建物調査の進捗に応じ、随時交渉開始
②更地（土地のみ）の地権者から交渉着手
（資料3参照）
